


別添 4 全体スケジュール（法対応及びメインフレーム脱却に向けたロードマップ）

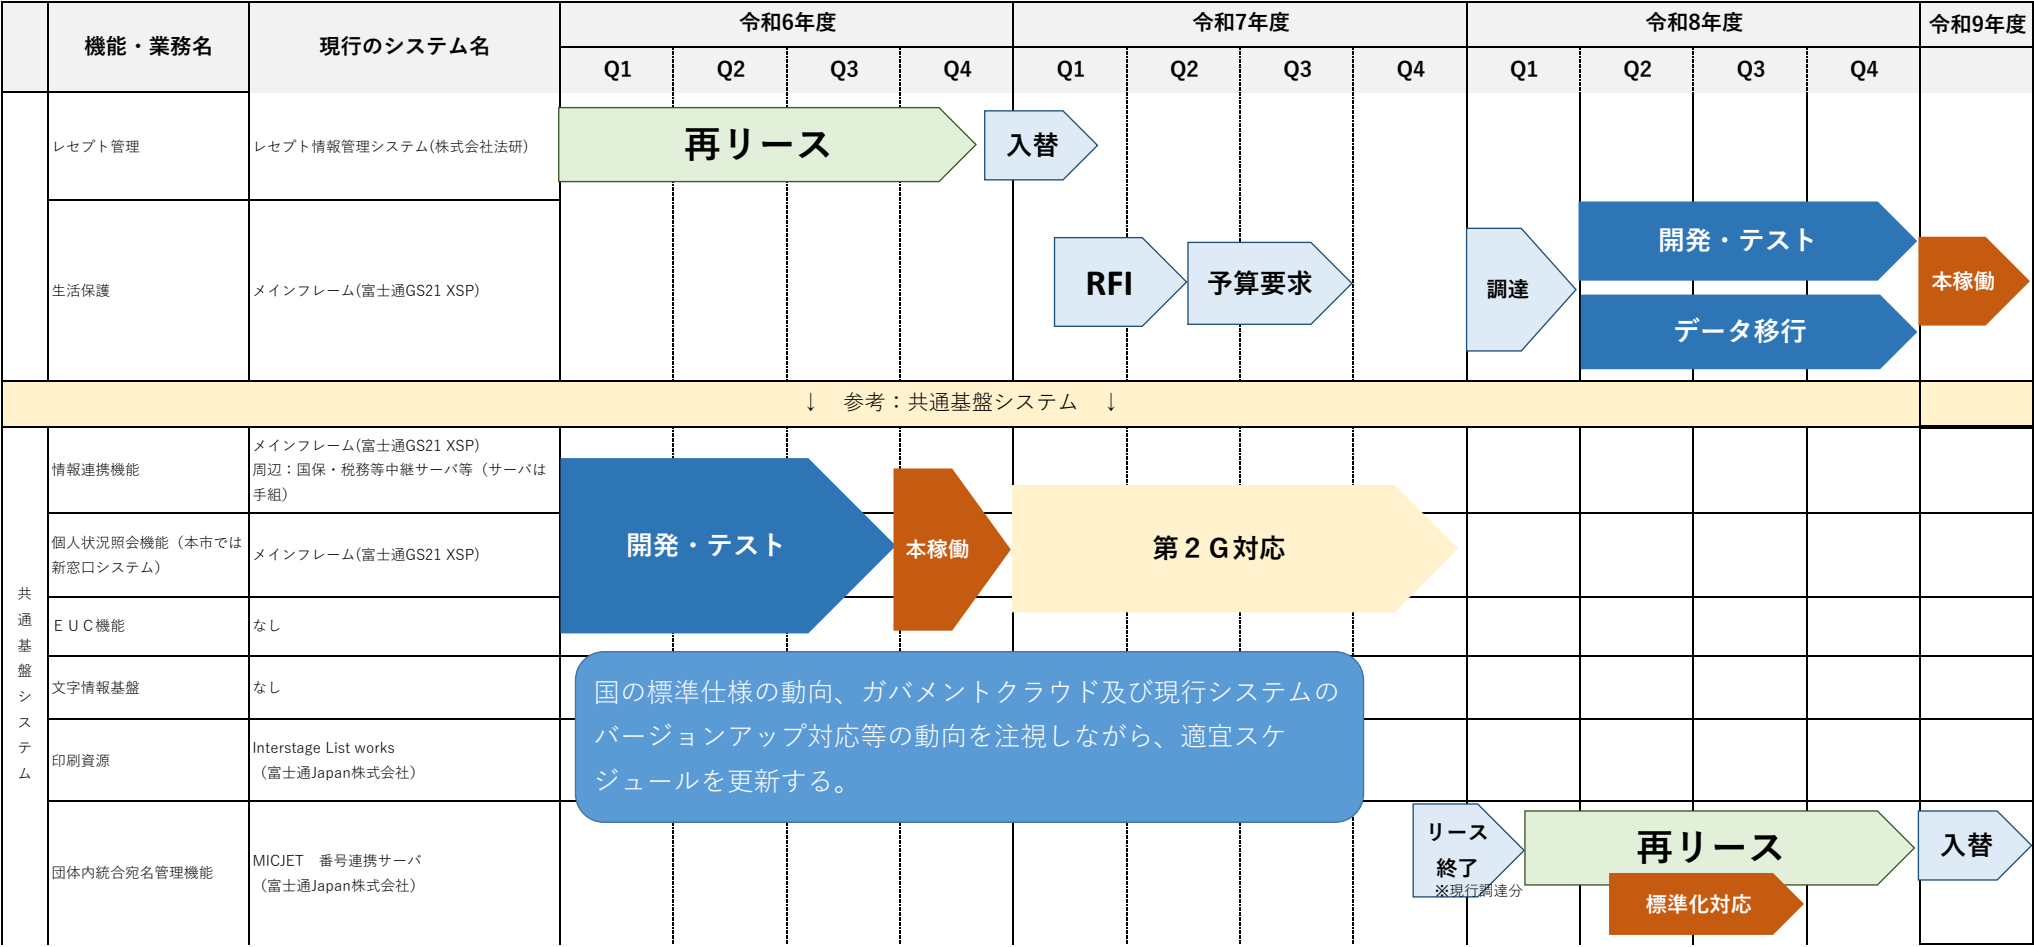

別添4 全体スケジュール（法対応及びメインフレーム脱却に向けたロードマップ）

機能・業務名	現行のシステム名	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
↓ 参考：標準準拠アプリケーション等 ↓															
第一グループ	住民基本台帳	MICJET住民記録 (富士通Japan株式会社)	開発・テスト 本稼働				残対応								
	印鑑登録	MISALIO (富士通Japan株式会社)													
	就学	ADWORLD 住民情報システム (株式会社日立システムズ)													
	介護保険	ADWORLD 住民情報システム (株式会社日立システムズ)													
	国民健康保険	国保標準システム (株式会社日立システムズ)													
第二グループ	選挙人名簿管理	メインフレーム(富士通GS21 XSP)	調達	開発・テスト				本稼働	現行リリース 終了						
	健康管理	健康づくり情報システム (株式会社富士コンピュータサービス)		データ移行				本稼働							
	障害者福祉	メインフレーム(富士通GS21 XSP) G-Trust II (株式会社アール・シー・エス)	調達	※現行システムのレベルアップ											
	第三グループ	児童手当	メインフレーム(富士通GS21 XSP)	調達	開発・テスト								本稼働		
児童扶養手当		メインフレーム(富士通GS21 XSP)													
国民年金		メインフレーム(富士通GS21 XSP)													
後期高齢者医療		メインフレーム(富士通GS21 XSP)													
子ども・子育て支援		メインフレーム(富士通GS21 XSP)	データ移行												

別添4 全体スケジュール（法対応及びメインフレーム脱却に向けたロードマップ）

	機能・業務名	現行のシステム名	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
ル ー プ	個人住民税	MICJET MISALIO住民情報ソリューション (富士通Japan株式会社)	調達				開発・テスト							本稼働	
	法人住民税	MICJET MISALIO住民情報ソリューション (富士通Japan株式会社)					データ移行								
	軽自動車税	MICJET MISALIO住民情報ソリューション (富士通Japan株式会社)													
	固定資産税	MICJET MISALIO住民情報ソリューション (富士通Japan株式会社)													
	徴収事務	MICJET MISALIO住民情報ソリューション (富士通Japan株式会社)													
						※現行システムのレベルアップ									
検 討 中	戸籍	MICJET 戸籍情報システム (富士通Japan株式会社)	Win11対応バージョンUP				RFI								
	戸籍附票	メインフレーム(富士通GS21 XSP) MICJET 戸籍情報システム (富士通Japan株式会社)	標準化に向けた検討												
関 連 シ ス テ ム	要援護者支援	メインフレーム(富士通GS21 XSP)	調達				開発・テスト								
							データ移行				本稼働				
	市営住宅等	メインフレーム(富士通GS21 XSP)						予算要求			調達	開発・テスト		本稼働	
											データ移行				
そ の 他	福祉医療	メインフレーム(富士通GS21 XSP)	RFI				RFI								
	被災者支援	J-LIS(クラサバ版)													

別添 4 全体スケジュール（法対応及びメインフレーム脱却に向けたロードマップ）

機能・業務名		現行のシステム名	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
↓ 参考：付帯業務 ↓															
	帳票の印刷及び発送業務の委託		※事業ごとに検討												
	データエントリ（パンチ）	データエントリシステム (CDSテクノロジーG-5Evo)	対象事務選定				調達	※準備できたところから随時稼働開始							
							各課業務システム開発・テスト				業務委託開始				
			現行リース契約				再リース予定								廃止予定
↓ 参考：内部情報系システム ↓															
内部情報系刷新	財務会計・契約管理	メインフレーム(富士通GS21 XSP)	開発・テスト		本稼働										
	入札情報（PPI）	富士通Japan株式会社	調達	開発・テスト				本稼働							
	文書管理・電子決裁	なし	調達	開発・テスト					本稼働						
